

Informe Scrum Master – Sprint 1

Sprint: 1

Fecha: 29/4/26

Acta de Sprint Planning

Actividades realizadas:

- Creación del proyecto en Jira para la gestión del trabajo en equipo.
- Definición de historias de usuario:
 - Registro de usuario
 - Inicio de sesión
- Creación de subtarefas asociadas a cada historia.
- Asignación de responsables para cada subtarea.
- Estimación de historias utilizando Planning Poker con escala tipo T-shirt size*.
- Definición de la meta del sprint.
- Inicio del sprint.

*Se utilizó la técnica de estimación T-shirt size debido a que resultó más sencilla para el equipo al momento de visualizar y comparar el tamaño relativo de las tareas dentro de las historias de usuario.

Seguimiento del Sprint

Proceso de trabajo:


- Se utilizó un flujo de trabajo basado en ramas (branching) y Merge Requests.
- La integración de cambios se realizó mediante Merge Requests al repositorio principal.

Observaciones:

- Al tratarse del primer sprint, se evidenciaron dificultades en la validación de cambios antes de su integración.
- Se detectaron problemas de coordinación entre los integrantes del equipo.
- La comunicación sobre el avance de las tareas no fue constante.


Artefactos de Seguimiento (Charts)

Burndown Chart

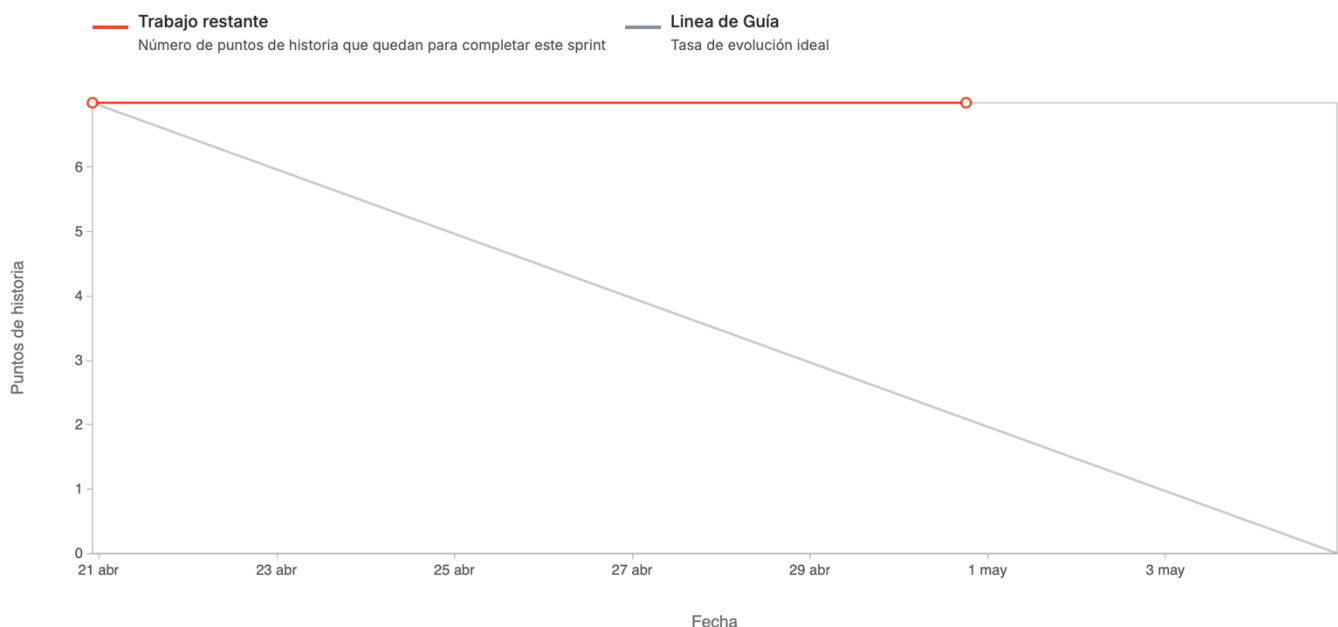


El Burndown Chart evidencia que los puntos de historia permanecieron constantes durante gran parte del sprint, alejándose de la línea ideal de progreso. Esto sugiere una falta de actualización continua del tablero. Además, el gráfico no refleja correctamente el trabajo realizado, ya que varias tareas no fueron cerradas adecuadamente en Jira antes de finalizar el sprint.

Burnup chart

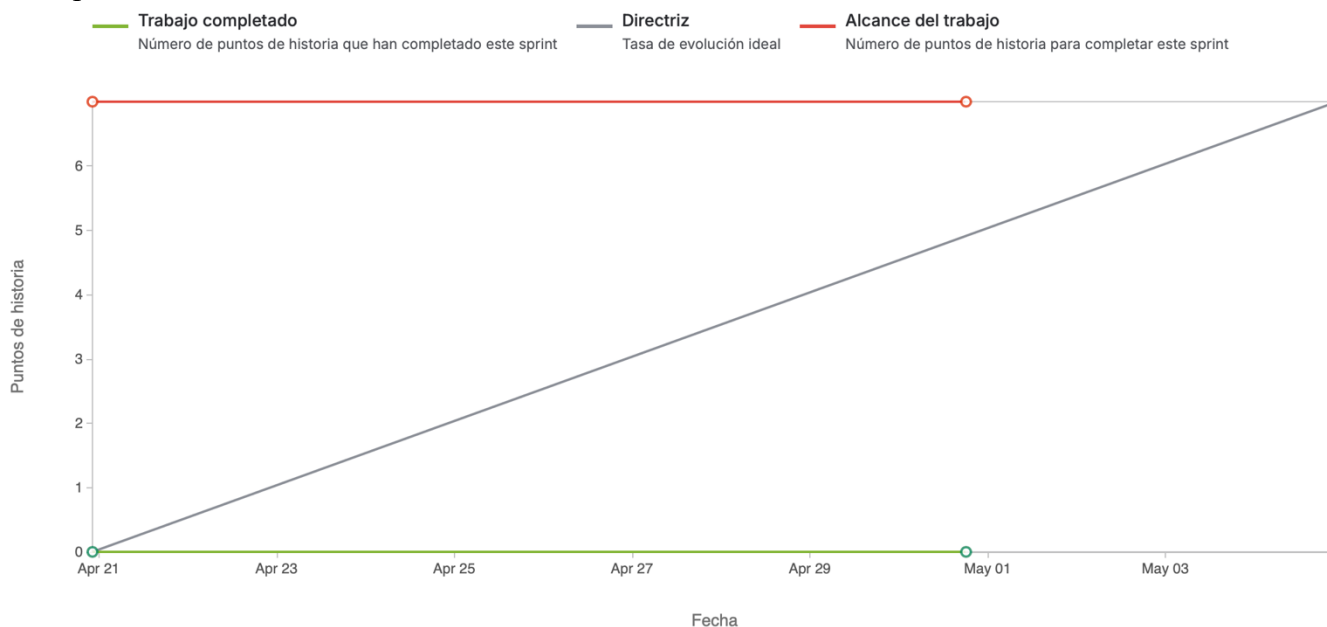


De manera similar, el Burnup Chart muestra que el alcance del sprint se mantuvo estable en 7 puntos de historia, lo cual indica una correcta definición inicial del trabajo. Sin embargo, el trabajo completado permaneció en cero durante gran parte del sprint, evidenciando una falta de seguimiento continuo en Jira.

Velocity Chart

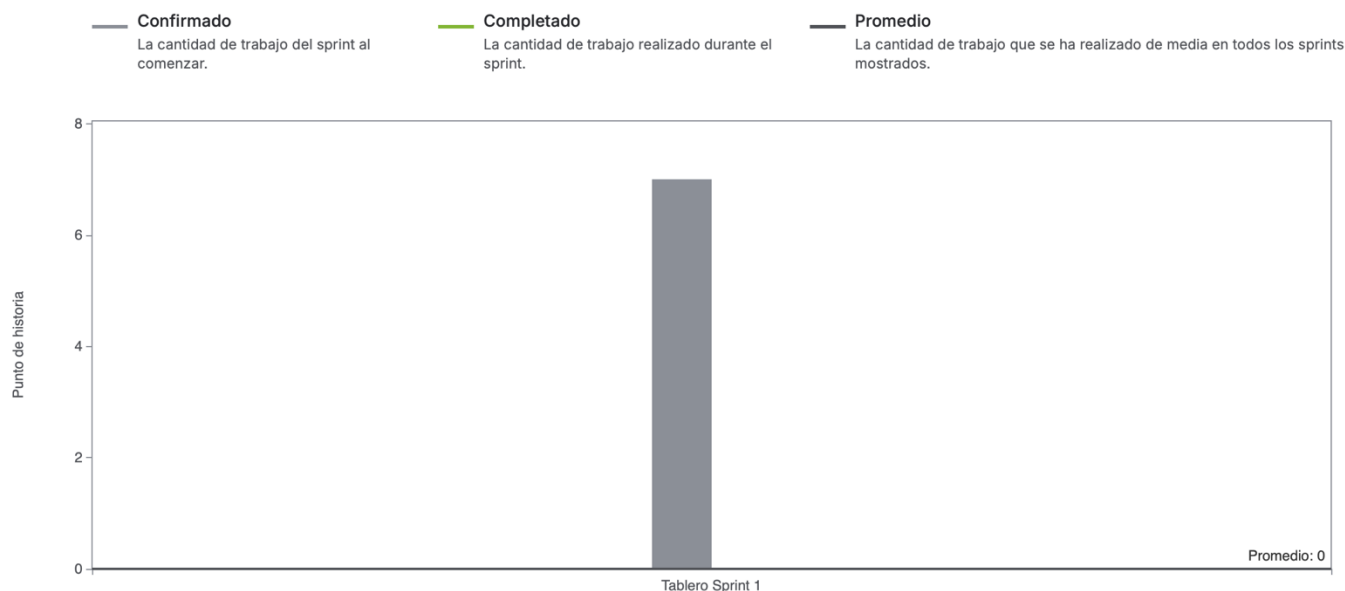

El Velocity Chart muestra que el equipo asumió un compromiso de 7 puntos de historia, pero no registró puntos completados al finalizar el sprint. Esto evidencia problemas en la actualización del estado de las tareas o en el cierre adecuado del sprint, afectando la medición real de la capacidad del equipo.

Diagrama de Flujo Acumulado:

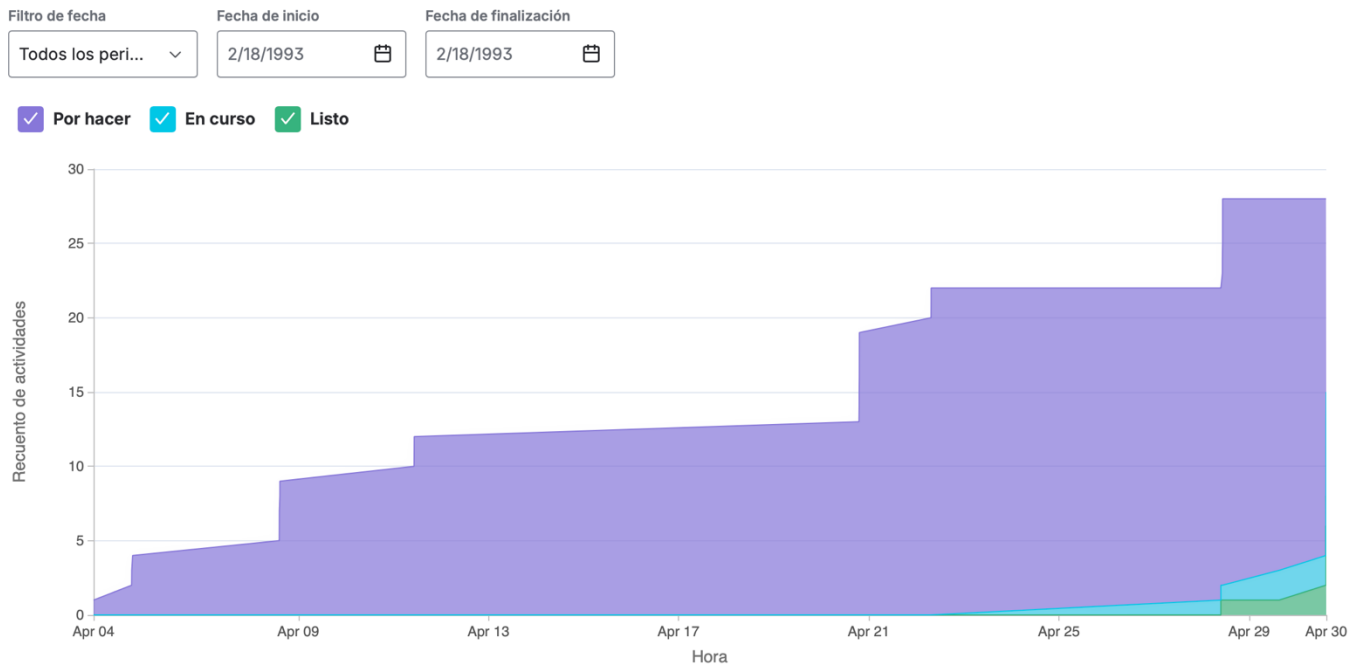

El Diagrama de Flujo Acumulado evidencia un crecimiento constante de tareas en estado Por hacer, mientras que las tareas en En curso y Listo aumentan recién hacia el final del sprint. Esto sugiere una incorporación continua de tareas durante el período y una actualización tardía de estados, afectando la visibilidad real del progreso del equipo

Como Scrum Master mis sugerencias de mejora serían:

- Definir mejor el sprint backlog al inicio con las subtareas claras y estimadas.
- Evitar agregar tareas durante el sprint.
- Actualizar el estado de las tareas diariamente.
- Asignar la responsabilidad individual de mantener actualizado el estado de cada subtarea.
- Cerrar las tareas apenas estén finalizadas.

Registro de Impedimentos

Impedimentos detectados:

- Dificultad para coordinar horarios entre los miembros del equipo.
- Falta de claridad en la validación de cambios antes de realizar merges. No se definieron criterios claros para aprobar Merge Requests antes de su integración.
- Comunicación insuficiente sobre el estado de las tareas.

Impacto:

- Retrasos en la finalización de algunas tareas.
- Falta de visibilidad sobre el progreso del sprint.

Estas dificultades se presentaron principalmente al inicio del sprint. Sin embargo, a medida que avanzó el trabajo, el equipo logró mejorar gradualmente su comunicación y coordinación.

Retrospectiva del Sprint

Continue (mantener):

- Uso de Jira para la organización del trabajo.
- Definición inicial de historias y tareas.
- Uso de branches por funcionalidad.
- Uso de Merge Requests para integrar cambios.

Stop (dejar de hacer):

- Falta de comunicación constante.
- Validaciones informales antes de integrar cambios.

Start (comenzar a hacer):

- Realizar reuniones diarias breves.
- Mejorar la definición de tareas antes de comenzar su desarrollo.

Acciones de Mejora**Acciones para el próximo sprint:**

- Implementar dailies cortas para mejorar el seguimiento del equipo.
- Definir criterios de aceptación antes de comenzar cada historia.
- Establecer revisiones obligatorias de Merge Requests antes de su integración.

Conclusión

El primer sprint permitió establecer las bases de trabajo del equipo, incluyendo la organización en Jira, la definición de historias de usuario y el uso de un flujo de trabajo basado en ramas.

Si bien surgieron dificultades propias de la etapa inicial, principalmente relacionadas con la comunicación, la coordinación y la adaptación a las herramientas y dinámicas de trabajo ágil, se identificaron oportunidades de mejora concretas que serán abordadas en el próximo sprint con el objetivo de optimizar el funcionamiento del equipo.
