

Sprint 2

29 de Abril - 13 de Mayo

Acta del Sprint Planning

Actividades realizadas

- Refinamiento y actualización del backlog en Jira.
- Definición de nuevas historias de usuario relacionadas con:
 - gestión de agenda
 - gestión de turnos
 - recuperación y cambio de contraseña
 - control de roles y permisos
- Creación de subtareas asociadas a cada historia.
- Asignación de responsables.
- Priorización de funcionalidades críticas para el sistema.
- Estimación de historias utilizando *Planning Poker* con escala tipo *T-shirt size*.
- Definición de la meta del sprint.
- Inicio del Sprint 2.

Meta del Sprint

Implementar funcionalidades relacionadas con agendas, turnos, autenticación y seguridad del sistema, mejorando la organización del trabajo e integración.

Seguimiento del Sprint

Proceso de trabajo

- Se continuó utilizando un flujo de trabajo basado en branches y Merge Request.
- Se trabajó mediante ramas separadas por funcionalidad.
- Se realizaron integraciones frecuentes sobre la rama *sprint 2*.
- Se incorporaron mejoras en la validación previa de cambios antes de realizar merges.
- Se utilizó nuevamente Jira para el seguimiento de épicas, historias y subtareas.

Observaciones

A diferencia del Sprint , durante este sprint se observaron los siguientes cambios:

- una mayor coordinación entre los integrantes
- mejor seguimiento en el backlog
- integración más frecuente de cambios

- incremento en la cobertura de testing
- mejor organización en las tareas

A su vez, se vio una mejora en:

- comunicación en el equipo
- manejo de merges
- control de estados en Jira

Resumen general del sprint

Resultado general:

Durante el sprint se hicieron las siguientes funcionalidades:

- Cambio de contraseña pre y post login del usuario.
- Visualización de agendas del lado del profesional.
- Manejo de estados y horarios de los turnos.
- Gestión de agendas por parte del profesional.

Estado de las tareas:

Finalizadas	En curso	Pendientes
Profesional con funciones de cliente	Crear super usuario	Verificación del mail con token
Cambio contraseña post login	Modificar turnos	Reservar turnos
Agenda profesional	Configuración de agenda	
Recuperar	Profesional puede ver sus agenda	
Cambio contraseña pre login	Profesional puede crear sus agendas	
Visualizar agenda		

Desarrollo de backlog

Gestión de contraseñas:

Cambio de contraseña desde el perfil

Las subtareas se completaron en su totalidad.

- ☒ Cambio ya logueado
- ☒ Cambio desde login
- ☒ Mostrar mensajes de error y confirmación
- ☒ Respetar requisitos de seguridad
- ☒ Cambio ya logueado

Gestión de Agendas y Turnos

Visualizar agenda

Las subtareas se completaron en su totalidad.

- ☒ Ver datos del cliente
- ☒ Ver horarios disponibles
- ☒ Ver estado del turno

Reservar turnos

La subtarea se dejó en estado pendiente

- ☐ Pago de seña/Confirmación

Modificar turnos

La subtarea se comenzó, pero no se logró terminar en su totalidad.

- ☐ Actualizo estado del turno

Configuración de agenda

Configuración de agenda

La subtarea se comenzó, pero no se logro terminar en su totalidad.

- ☐ Definir turnos diarios

Gestión de profesionales

Profesional puede ver sus agendas


La historia no tenía historias asociadas, pero estaba en curso.

Profesional puede crear agendas

La historia no tenía historias asociadas, pero estaba en curso.


Métricas

Burndown Chart

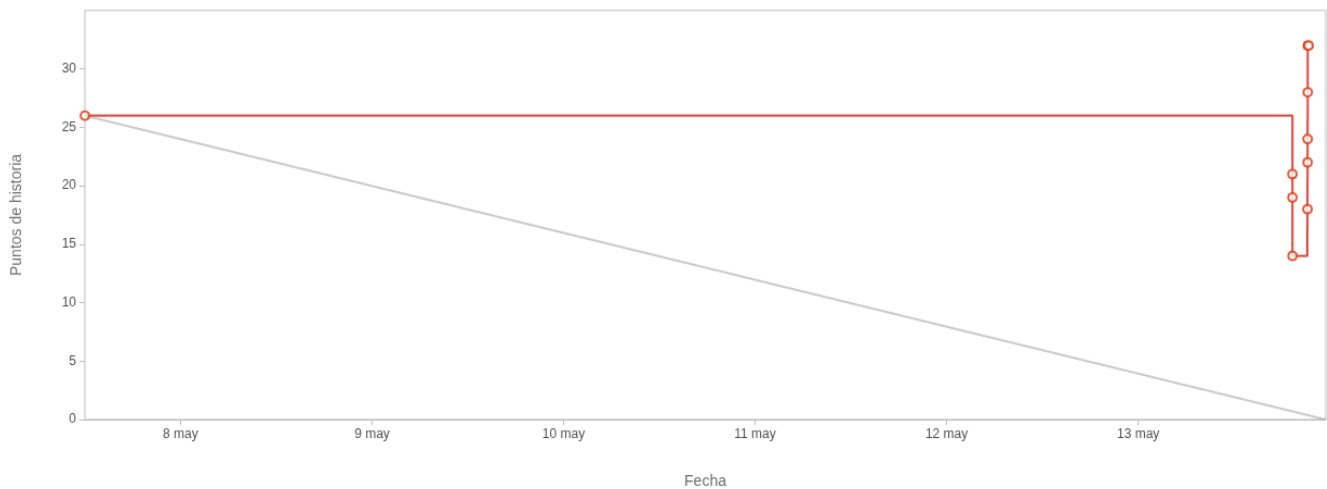


A diferencia del sprint 1 en esta ocasión, se como cercano al 13 de mayo se marcaron algunas tareas hechas ganando puntos.

Burnup Chart

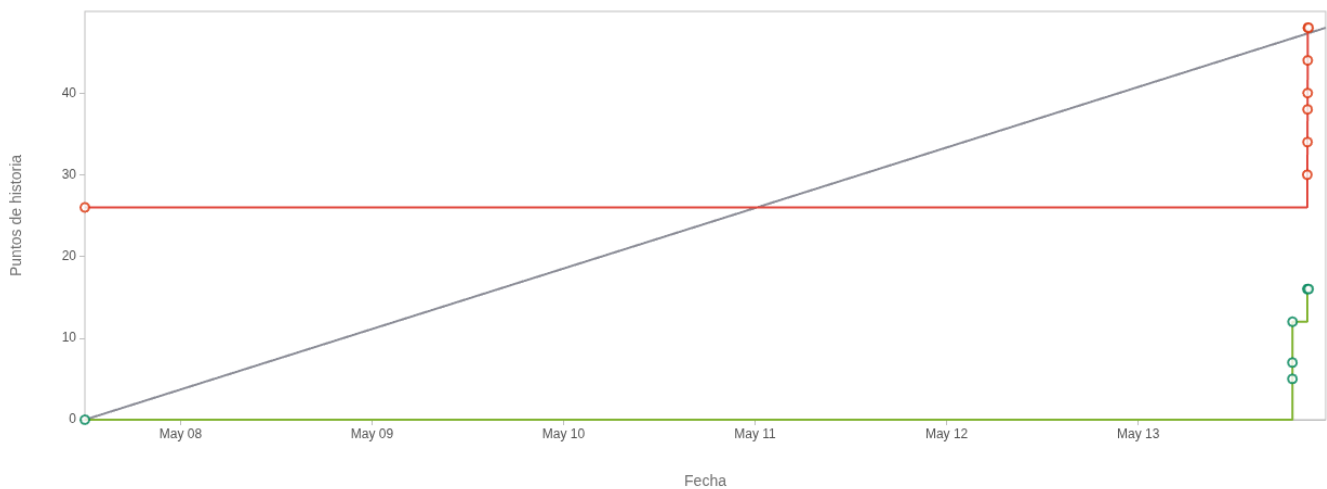


A diferencia del sprint 1 en esta ocasión, muestra un alcance mejor iniciando alrededor de 26 puntos y aumentando casi 50. En cuanto al trabajo completado (línea verde) termina alcanzando alrededor de 15.

Velocity Chart

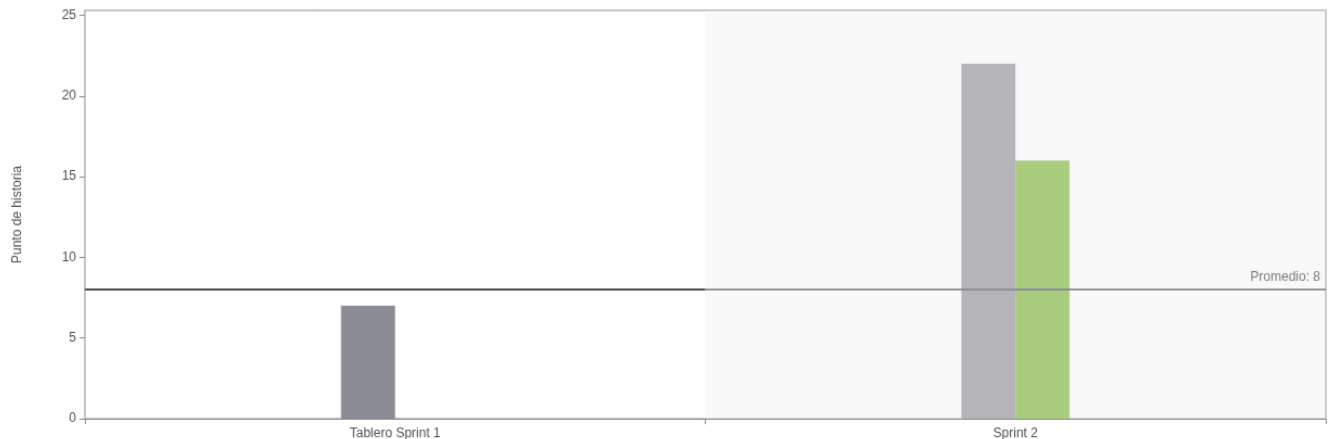

A diferencia del sprint 1 en esta ocasión, se muestra un compromiso de casi 25 puntos pero con un total de casi 20 puntos. Al progreso hecho en este sprint, el promedio quedó en 8 puntos.

Diagrama de Flujo Acumulado

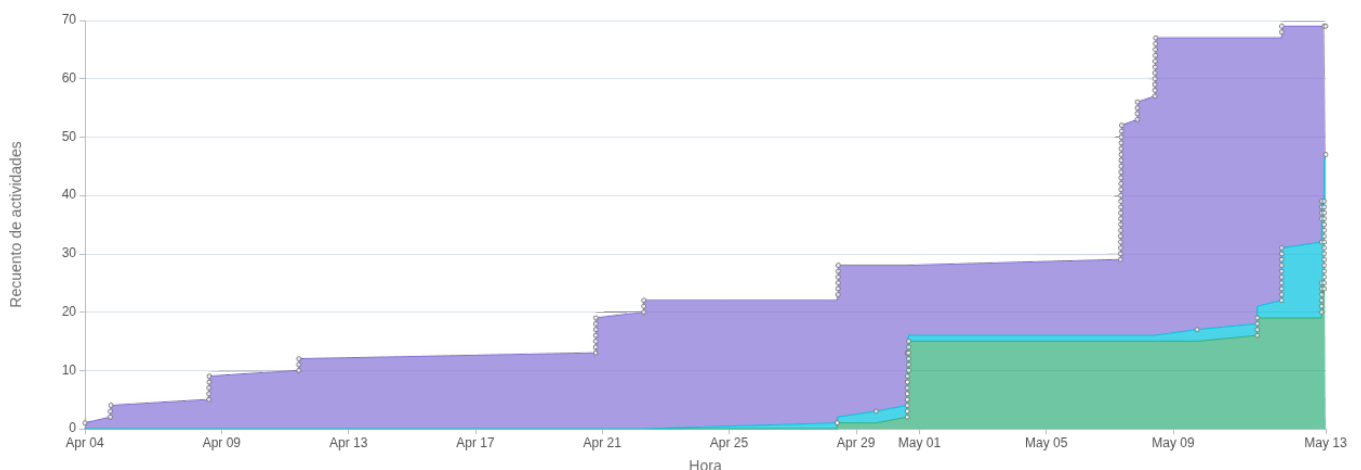

A diferencia del sprint 1 en esta ocasión, cubre un rango más amplio de días. El volumen total creció casi a 70. Y el estado de “listo” y “en curso” empiezan a ganar valor después del 9 de mayo.

Conclusión

Tras los problemas detectados en el sprint 1 (coordinación y actualización), el equipo aumentó drásticamente su volumen de trabajo y capacidad de cierre. Pero, persiste la tendencia a actualizar y cerrar la mayoría de tareas el ultimo día.

Registro de impedimentos

Impedimentos detectados

- Algunos conflictos a la hora de mergear
- Ajustes necesarios en test, trar refactorizar código

Impacto

- Retraso parciales en algunas historias
- Refactorizar componentes ya implementados
- Tiempo adicional a testing e integración

Resolución

El equipo logró llevar a cabo los impedimentos mediante:

- Merges frecuentes
- Comunicación activa por parte del equipo

Retrospectiva del Sprint

Continue

- Uso del Jira
- Trabajo mediante branches por funcionalidad
- Uso de merge request
- Testing de integración
- Las historias de usuario y tareas propuestas
- Comunicación activa del equipo

Stop

- Integrar cambios grandes sin sincronización previa
- Posponer actualización de estados en Jira
- Resolver conflictos de merge sobre el final del sprint

Start

- Integración más frecuente
- Refinar mejor las historias de usuario
- Revisión temprana de dependencias entre tareas

Acciones de mejora

Para el próximo sprint lo ideal sería ya dar por finalizado las funcionalidades de agenda y turnos. Definir bien una base de lo que queremos lograr así todo el equipo sigue la misma línea. Mejorar la estimación de historias complejas.

Conclusión

El sprint 2 representó una mejora respecto al sprint 1 tanto en aspecto de organización como de desarrollo. El equipo logró aumentar el volumen de trabajo realizado, mejorar la integración entre funcionalidades y avanzar entre los módulos. También se observó una mejora en la coordinación, en la comunicación y un seguimiento un poco más activo del backlog. En cuanto a las metodologías se mantuvieron las del sprint 1.

Sin embargo, persisten los problemas relacionados con la actualización de las tareas y el cierre de historias principalmente en el final del sprint. A su vez, quedaron funcionalidades de agenda y/o turnos que quedaron parcialmente hechas. Por lo que deberán ser realizadas durante el próximo sprint.

En conclusión, el sprint 2 permitió consolidar la base de trabajo un poco más estable y más organizada, mostrando evolución del equipo y dejando nuevos puntos que ya se tendrán en cuenta en los próximos sprints.
