

Informe Scrum Master - Sprint 3

13 de Mayo - 27 de Mayo

Acta de Sprint Planning

Actividades realizadas

- Refinamiento y actualización del backlog en Jira.
- Definición de nuevas historias de usuario relacionadas con:
 - Personalización de perfil.
 - Especificación de sector y profesión.
 - Herramienta de gestión de turnos para el profesional.
 - Superadmin con control sobre las agendas de los profesionales.
 - Corrección de la autobúsqueda de agenda como profesional.
 - Profesional puede configurar sus rango de horarios y días disponibles.
- Creación de subtareas asociadas a cada historia.
- Asignación de responsables.
- Priorización de funcionalidades críticas para el sistema.
- Estimación de historias utilizando Planning Poker con escala tipo T-shirt size.
- Definición de la meta del sprint.
- Inicio del Sprint 3.

Meta del Sprint

Implementar funcionalidades relacionadas con superadmin, refinar las herramientas de gestión de turnos del profesional, seguridad con validaciones a través de mails y mayor customización de perfil.

Seguimiento del Sprint

Proceso de trabajo

Se mantuvo la misma metodología de trabajo utilizada en los sprints anteriores, basada en el uso de branches, Merge Requests e integraciones frecuentes. Asimismo, se continuó utilizando Jira para el seguimiento y organización de las tareas del sprint.

Observaciones

A diferencia del Sprint, durante este sprint se observaron los siguientes cambios:

- Se agilizó la definición de historias de usuario y la asignación de responsables para cada tarea.

- Se incrementó el uso de Jira para registrar y dar seguimiento al avance de las historias de usuario a medida que eran desarrolladas.
- Se detectaron dificultades en el seguimiento de algunas subtarefas que no tuvieron una actualización e iteración constante durante el desarrollo.

Desarrollo del Backlog

Durante el Sprint 3 se completaron las siguientes historias de usuario:


- Verificación de mail con un token por tiempo
- Profesional puede ver su agenda
- Configuración agenda
- Profesional no se puede auto-buscar
- Agregado del sing up
- Personalizar perfil
- Crear un super administrador
- Re-organizar agenda
- Herramienta de gestión de turnos
- Especificar profesión

Por otro lado, las siguientes historias de usuario quedaron en curso:

- Simulación de pagos
- Aviso por mail ante cancelación de turno


Métricas

Burndown Chart

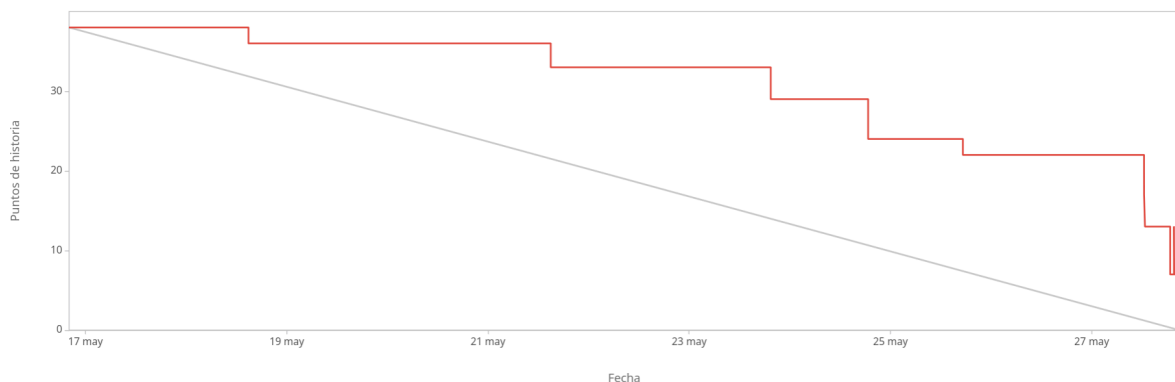


A diferencia de los sprints anteriores, se observa una mayor interacción y actualización de las historias de usuario a medida que eran desarrolladas y finalizadas. La métrica no alcanza el valor 0 debido a que quedaron dos historias sin completar al cierre del sprint.

Burnup Chart

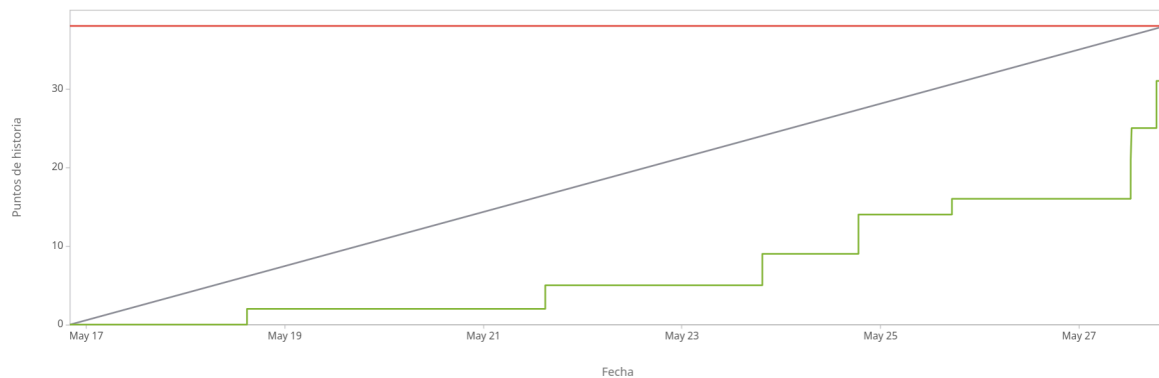


De forma inversa, se observa el mismo comportamiento en el gráfico de burnup chart, donde el progreso de las historias aumenta gradualmente a medida que estas son finalizadas durante el sprint.

Velocity Chart

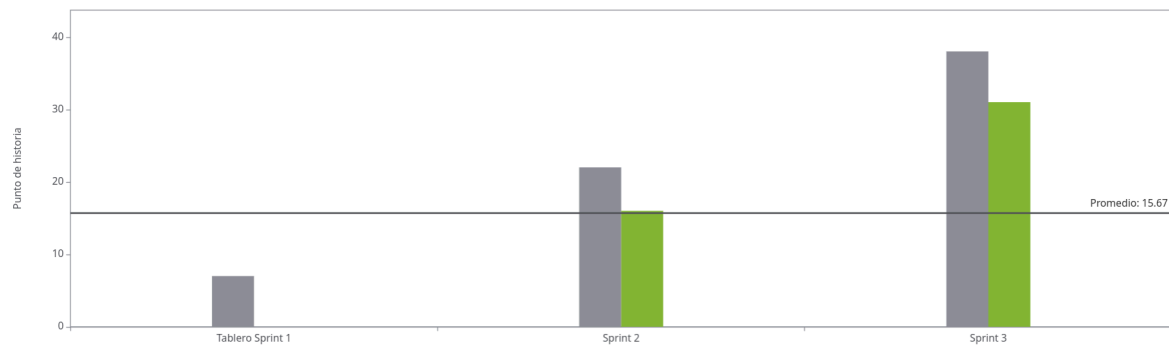

Se puede observar que, a diferencia de los sprints anteriores, la suma total de puntos de historia de este sprint fue considerablemente mayor. Asimismo, el progreso alcanzado también resultó superior, tal como se refleja en el gráfico de velocity chart.

Diagrama de Flujo Acumulado

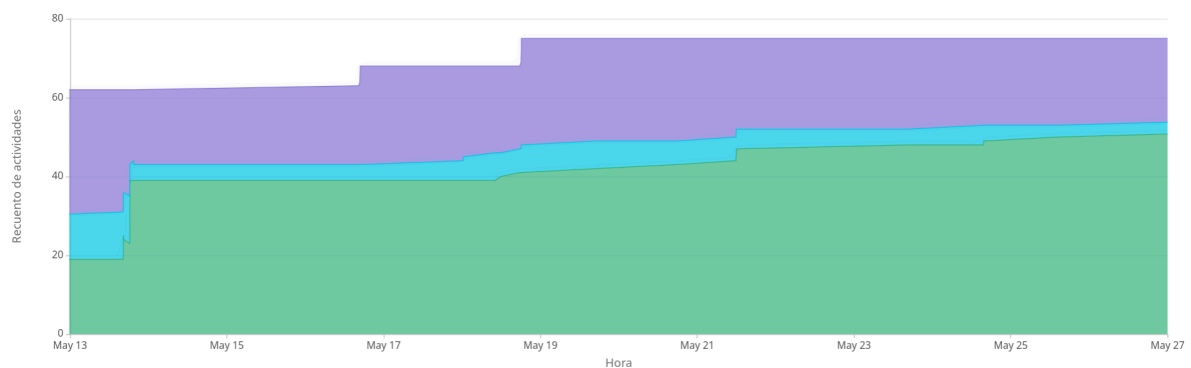

En este gráfico se observa una mejor planificación del backlog, ya que se agregaron muy pocas historias en comparación con los sprints anteriores. Además, puede verse que la cantidad de historias en curso mantuvo una proporción similar respecto de las historias finalizadas a lo largo de toda la etapa.

Registro de impedimentos

Impedimentos detectados

- Se identificaron historias de usuario con dependencias entre sí que habían sido asignadas a distintas personas del equipo.
- Surgieron inconvenientes relacionados con el entorno de despliegue.

Impacto

- Algunas tareas no pudieron avanzar hasta que las historias de las cuales dependían estuvieran finalizadas.
- El problema en el entorno de despliegue generó un retraso en la publicación planificada para ese mismo día.

Resolución

El equipo logró llevar a cabo los impedimentos mediante:

- Se reorganizaron tareas dentro del equipo, permitiendo que otra persona avanzara.
- El inconveniente de despliegue pudo solucionarse luego de algunas horas de retraso.

Retrospectiva del Sprint

Continue

- Mantener el uso constante de Jira para el seguimiento y actualización de historias de usuario.
- Continuar con las integraciones frecuentes y el flujo de trabajo basado en branches y Merge Requests.
- Seguir mejorando la planificación y asignación de responsables para cada tarea.

Stop

- Evitar asignar historias dependientes a distintas personas sin una coordinación previa.
- Dejar de descuidar el seguimiento y actualización de algunas subtareas durante el desarrollo.
- Evitar realizar despliegues con poco tiempo de anticipación.

Start

- Incorporar un seguimiento más frecuente de las subtareas dentro de cada historia de usuario.
- Planificar con mayor anticipación las dependencias entre historias.
- Realizar despliegues y pruebas del entorno con mayor anticipación para detectar posibles inconvenientes antes de la fecha planificada de publicación.

Acciones de mejora

Para el próximo sprint, el cual corresponde a la etapa final del proyecto, sería ideal:

- Mantener una planificación estable del backlog y priorizar únicamente las historias esenciales para el cierre del sistema.
- Realizar pruebas de integración y despliegues parciales con anticipación para detectar problemas antes de la entrega final.
- Destinar tiempo específico para corrección de errores, refactorización y validaciones finales del sistema.

Conclusión

El Sprint 3 presentó una mejora significativa en la organización y seguimiento de las tareas en comparación con etapas anteriores. Se logró completar una gran cantidad de historias de usuario y mantener un progreso constante durante el desarrollo.

Asimismo, se identificaron dificultades relacionadas con el seguimiento de algunas subtareas y con dependencias entre historias, las cuales sirvieron como aprendizaje para optimizar la planificación del próximo sprint.

De cara a la etapa final del proyecto, el equipo cuenta con una base funcional sólida y con una mejor comprensión del flujo de trabajo necesario para alcanzar una entrega estable y completa del sistema.
