

Informe Scrum Master - Sprint 4

27 de mayo - 10 de junio

Acta de Sprint Planning

Actividades realizadas

- Refinamiento y actualización del backlog en Jira.
- Definición de nuevas historias de usuario relacionadas con:
 - _ Simulación de pagos
 - _ Ante indisponibilidad mandar mail para reprogramar el turno
 - _ Envío de recordatorios
 - _ Mejorar el buscador por filtro de sector y/o servicio
 - _ Mayor información sobre el profesional
- Creación de subtareas asociadas a cada historia.
- Asignación de responsables.
- Priorización de funcionalidades críticas para el sistema.
- Estimación de historias utilizando Planning Poker con escala tipo T-shirt size.
- Definición de la meta del sprint.
- Inicio del Sprint 4.

Meta del Sprint

Mejorar las funcionalidades en cuanto a la búsqueda, reserva, reprogramación y recordatorio del turno con el objetivo de ya entregar un producto de valor.

Seguimiento del Sprint

Proceso de trabajo

Se siguió trabajando con la misma metodología basada en

el uso de branches, Merge Requests e integraciones frecuentes y continuando usando Jira para el seguimiento y organización de las tareas del sprint..

Observaciones

- Como equipo ya estamos más ágiles con la utilización de jira, a diferencia de sprints anteriores donde estamos muy desorganizados.
- Las reuniones de lo que hay que hacer, la distribución de tareas y las estigmatizaciones de historias de usuario son cada vez más rápidas.

Desarrollo del Backlog

Durante el sprint 4 se completaron las siguientes historias de usuario:


- Simulación de pagos
- Ante indisponibilidad mandar mail para reprogramar el turno
- Envío de recordatorios
- Mejorar el buscador por filtro de sector y/o servicio
- Mayor información sobre el profesional

No quedó ninguna historia de usuario por hacer. También se hicieron algunos pequeños detalles en cuanto a la interfaz de como se ve el perfil de usuario pero no fueron considerados necesarios hacer una historia de usuario para ello.

Métricas


Los gráficos siguientes pueden presentar algunas anomalías dado que cometimos el descuido de iniciar el sprint sin antes haber puesto la estigmatización a las historias de usuarios. Nosotros para este sprint-4 definimos las historias de usuarios iniciamos el sprint y después les pusimos la estigmatización a las historias, y esto provocó que ciertos gráficos no salgan del todo bien.

Burndown Chart

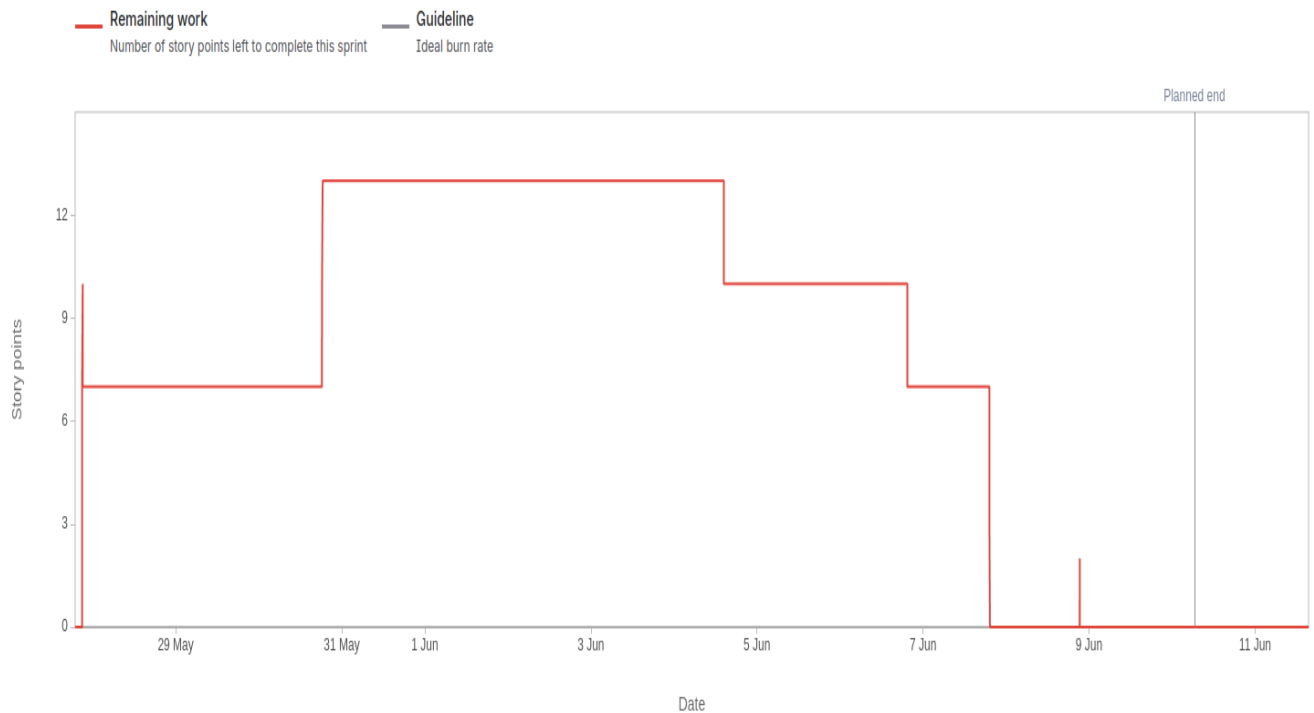


Por lo dicho anteriormente esto generó para el gráfico Burndown Chart que Jira registrara un incremento en el trabajo restante alrededor del 31 de mayo (cuando se cargaron las estimaciones faltantes), en lugar de reflejar una reducción progresiva del trabajo(no fue una incorporación de nuevas tareas) y como Jira calcula la línea ideal al momento exacto en que se inicia el sprint, tomando el total de story points que hay en ese instante como punto de partida, el guideline no aparición por no haber story points cuando se inició el sprint

Velocity Chart

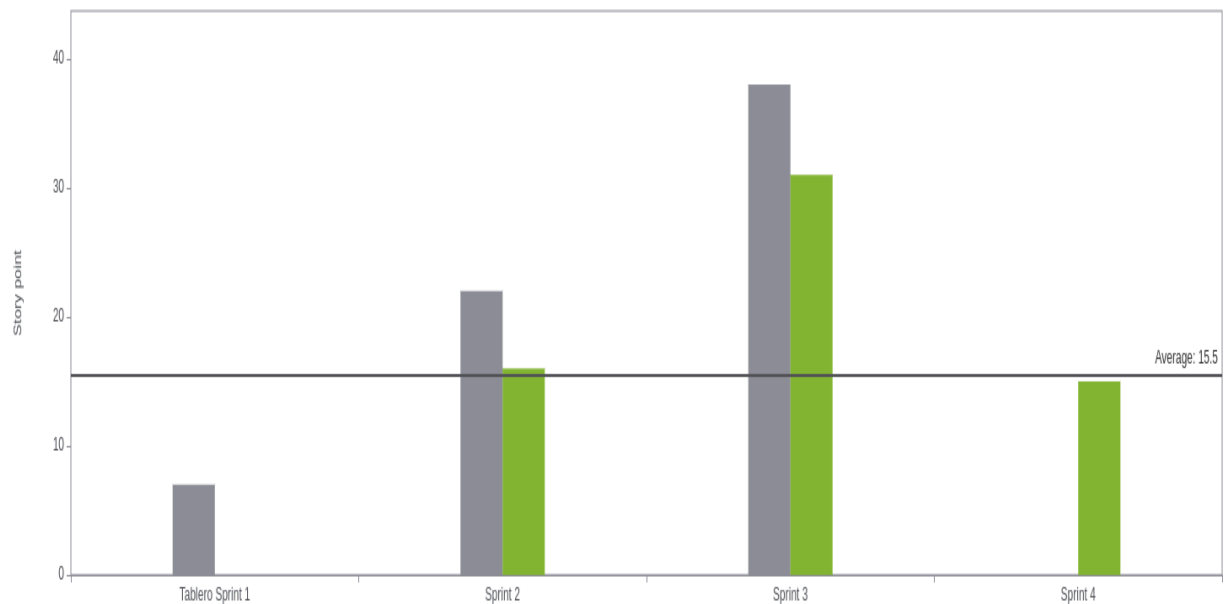


El velocity report muestra un compromiso de 0 puntos para el Sprint 4, por el mismo inconveniente ya mencionado: las estimaciones fueron asignadas con posterioridad al inicio del sprint, por lo que Jira no registró un compromiso inicial. Los 15 puntos completados sí representan el trabajo efectivamente finalizado durante el sprint complementando todas las historias para este sprint.

Burnup Chart

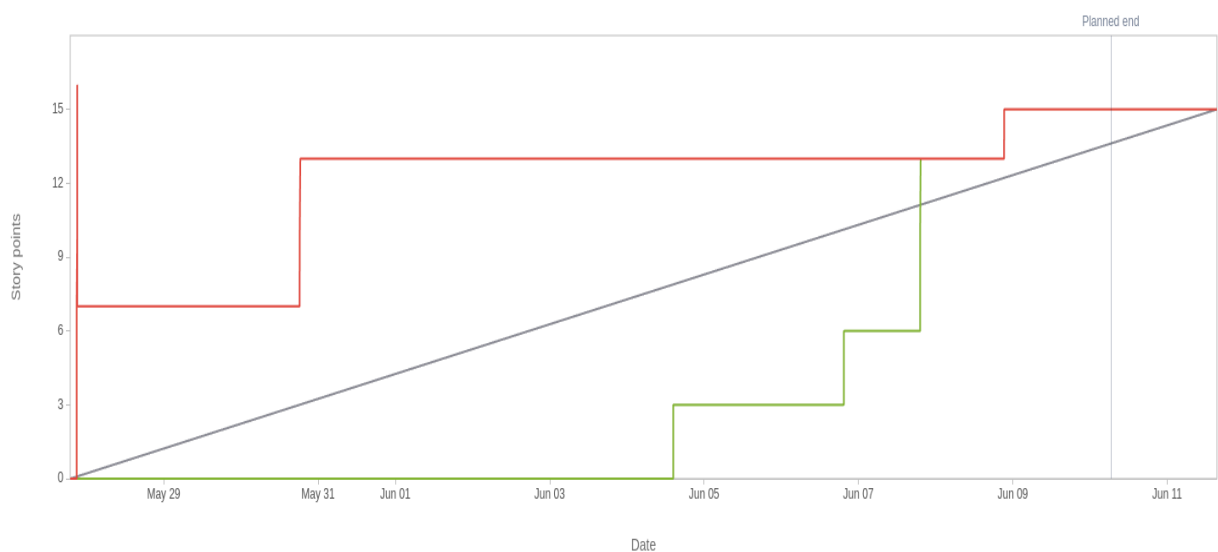

El burnup report del Sprint 4 refleja con mayor claridad el progreso real del equipo. El trabajo completado comenzó a registrarse recién en la segunda semana del sprint, acumulando 15 puntos hacia el final logrando que el equipo complete el trabajo.

Diagrama de Flujo Acumulado

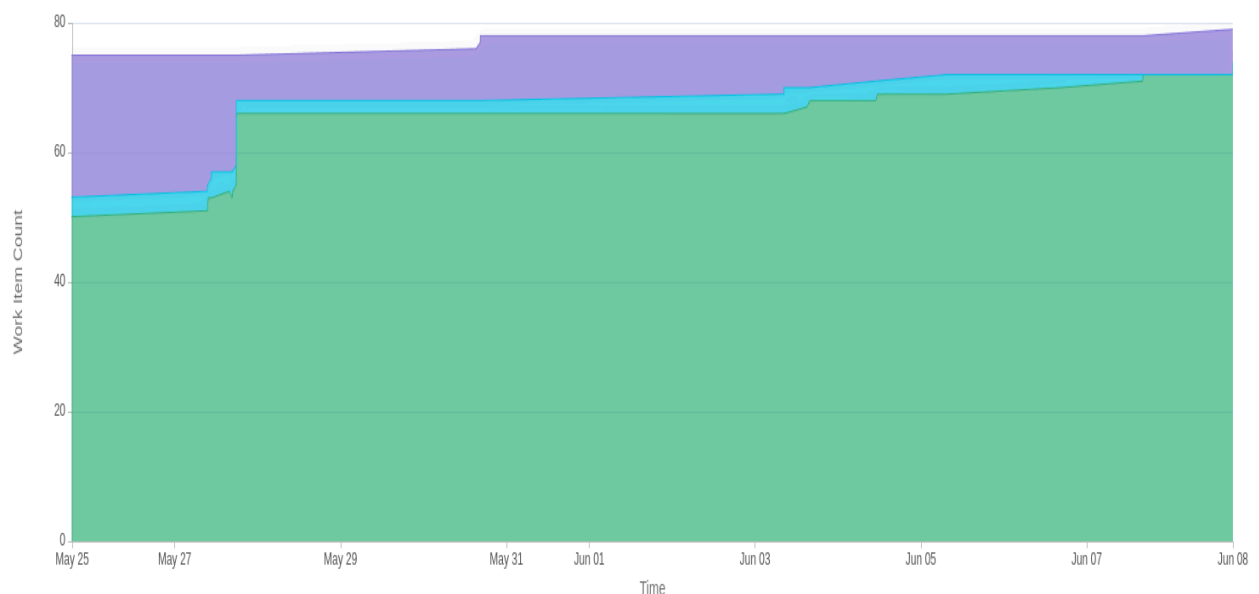

Todas las tareas fueron completadas, no quedaría nada por hacer aunque el gráfico no muestra lo mismo, eso se debe a que se olvidó borrar una historia de usuario que quedó viaje y que estaba mal formulada, actualmente ya se borró pero después del cierre de este sprint.

Registro de impedimentos

Para este sprint tuvimos la suerte de no tener ningún impedimento que nos haya impedido poder avanzar. El problema más grave que tuvimos sprints anteriores fue con el deploy del programa y para este sprint no tuvimos ningún problema con respecto a eso. Y esto se puede ver

reflejado en cómo el equipo para este sprint pudo completar todas las tareas asignadas.

Retrospectiva del Sprint

Continue

- Uso del Jira
- Trabajo mediante branches por funcionalidad
- Uso de merge request
- Testing de integración
- Seguir con la buena comunicación

Stop

- No dejar para después la estigmatización de las historias de usuarios. Hacerlo antes de iniciar el sprint.

Start

- Empezar hacer una retrospectiva de si lo que estamos haciendo en el jira está bien o mal, para seguir mejorando en el uso del jira.

Acciones de mejora

Dado a que este es el último sprint, aún se puede mejorar para próximos proyectos una mejor comunicación antes de iniciar el proyecto, dado que eso al inicio nos provocó un atraso y desorganización, y con el tiempo mejorando ese aspecto el avance del proyecto fue mejorando en cuanto a la velocidad de entregar y repartir tareas.

Conclusión

Como conclusión (sacando el descuido de iniciar el sprint antes de poner las estigmatizaciones a las historias de usuarios), el equipo para este sprint trabajó de una manera muy organizada y rápida mejorando

funcionalidades en lo que respecta al turno, logrando incorporar todos los cambios que se le indicaron al grupo y ya teniendo un producto listo para usarse correctamente.
